




### Geachte bewoner, eigenaar of geïnteresseerde,

Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief voor het project Ecologische Optimalisatie Cortenoever. In deze nieuwsbrief willen we het volgende met u delen:

- Wat er de afgelopen periode is gebeurd;
- Wat er de komende periode gaat gebeuren;
- Hoe u ons kunt bereiken bij vragen.

[Voorgaande nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.](#)

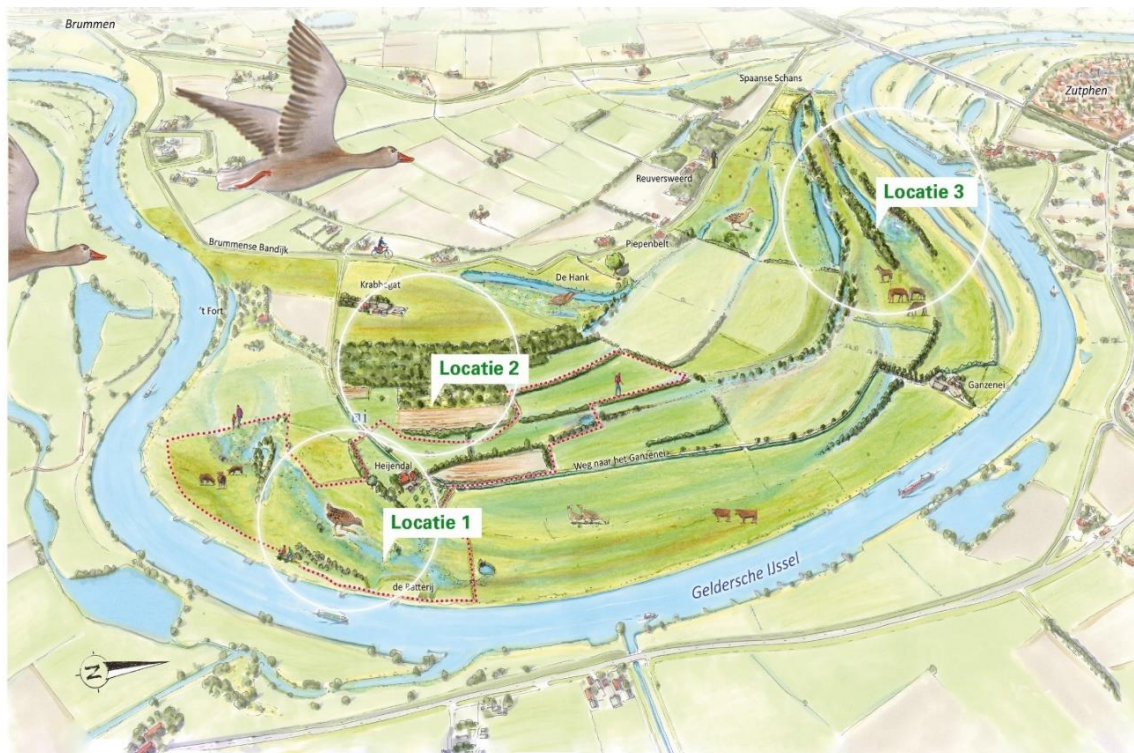

### Korte terugblik

Het doel van het project is om het huidige gebied in Cortenoever zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat. Een natuurgebied met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, komen daardoor weer terug in de uiterwaarden.

Om dit te realiseren, wordt gewerkt aan het volgende:

- Uiterwaardverlaging door het uitdiepen van oorspronkelijke kronkelwaardgeulen. Hierdoor komt er meer water in de uiterwaarden. Daarnaast breiden we het bloemrijk grasland uit;
- Het uitbreiden van de bestaande boskernen met onder andere hardhout ooibos uit. Dit ooibos is zeldzaam in Nederland.

Meer informatie over de achtergrond van het project (o.a. in ontwerptekeningen en filmpjes) kunt u vinden op de volgende website: [www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/cortenoever](http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/cortenoever).





### *Wat is er afgelopen periode gebeurd?*

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de laatste fase van de voorbereiding op het project. De meeste werkplannen zijn geschreven, inkoop van de te leveren materialen is verzorgd en werkvergunningen zijn aangevraagd.

### *Starthandeling*

Woensdag 11 mei vond de officiële starthandeling van het project plaats. In aanwezigheid van Wethouder P. Inberg van de Gemeente Brummen, bewoners van het projectgebied en de samenwerkingspartners van Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en Staatsbosbeheer werd de eerste schop in de grond gezet als symbolische start van de werkzaamheden.

### *Niet Gesprongen Explosieven*

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt het projectgebied momenteel onderzocht op de aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Tot op heden zijn er twee, nog intacte, mortiergranaten uit de 2<sup>e</sup> Wereldoorlog aangetroffen (foto linksonder) en meerdere reststukken van verschoten mortiergranaten. Indien er een NGE wordt aangetroffen, wordt deze veilig gesteld en overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Verder is er een loop van een musket en een houwdegen uit de tachtigjarige oorlog (foto rechtsonder) aangetroffen.





### Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Onderaan deze pagina ziet u in hoofdlijnen de planning voor dit jaar. Een aantal punten willen we hieruit toelichten:

#### 1. Werkzaamheden zuidkant

Aan de zuidkant van het projectgebied zijn we gestart met de eerste werkzaamheden van het project. Dit betreft het opsporen van niet gesprongen explosieven en het vrijgeven van het gebied. Verder treffen we voorbereidende werkzaamheden zoals maaien en het aanvoeren van materieel en materiaal. Daarnaast bouwen we de komende periode een losvoorziening langs de IJssel, waarmee we de grond op schepen kunnen laden en afvoeren.

Vanaf juni gaat de eerste grond ontgraven worden. Deze grond transporteren we via een vaste route af naar de IJssel, vanaf daar wordt de grond per schip afgevoerd.

Een overzicht van de werkzaamheden in het zuidelijk deel:

- Overslagvoorziening aanbrengen langs de IJssel;
- Geulen verdiepen;
- Maaiveld verlagen;
- Vervangen of verwijderen duikers;
- Realiseren natuurcompensatie;
- Aanbrengen beplanting (najaar 2022).

De afvoer van de grond vindt plaats over het water.

#### 2. Werkzaamheden noordkant

Nadat de grondwerkzaamheden aan de zuidkant zijn afgerond gaan we vanaf medio juli verder aan de noordkant. Afvoer van de grond vindt ook hier plaats via het water.

#### 3. Overige werkzaamheden

Naast de grondwerkzaamheden voeren we de volgende overige werkzaamheden uit:

- Herstel van het sluisje “De Spaanse Schans” om deze weer bruikbaar te maken voor een betere hoogwaterbeheersing;
- Aanbrengen van rasters en hekken ter bescherming van het aan te brengen groen;
- Planten van een nieuw ooibos.

Overzichtplanning Cortenoever	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Voorbereiding												
Voorbereidende werkzaamheden: o.a. rooien bomen, maaien, grondonderzoeken												
Aanbrengen/verwijderen loswal bij de IJssel												
Graafwerkzaamheden Zuidelijk deel												
Graafwerkzaamheden Noordelijk deel												
Inzaaien Beplanting Natuurcompensatie												
Aanbrengen Afrastering en overige voorzieningen												
Planten Ooibos												
Werkzaamheden gereed												



### Hoe kunt u ons bereiken?

#### BouwApp

Naast de gebruikelijke communicatie met bijvoorbeeld deze nieuwsbrief kunt u ook op de hoogte blijven over de voortgang van het project middels de BouwApp. In de aankomende periode zullen wij daar updates plaatsen over de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast kunt u ook via de app vragen stellen of contact opnemen. Via het volgende stappenplan kunt u de BouwApp gebruiken:

1. Download en installeer 'De BouwApp' via [Google Playstore](#) of [Apple Store](#);
2. Ga naar: 'zoek op projectnaam of plaats';
3. Zoek op 'Ecologische optimalisatie Cortenoever';
4. Klik op het project;
5. Klik op 'volgen'.

#### Telefonisch/E-mail

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het team. In verband met de vakantieperiode is dit voor de komende periode - tijdelijk waarnemend - Omgevingsmanager Twanne Roor. Hij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op het volgende nummer:

- 06-13 33 40 17

Via de e-mail kunt u ons bereiken via:

- [vdh-cortenoever@herik.nl](mailto:vdh-cortenoever@herik.nl)

**Vriendelijke groet namens het projectteam van Van den Herik Sliedrecht**



## de BouwApp.

