




Geachte bewoner, eigenaar of geïnteresseerde,

Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief voor het project Ecologische Optimalisatie Cortenoever. In deze nieuwsbrief willen we het volgende met u delen:

- Wat er de afgelopen periode is gebeurd;
- Wat er de komende periode gaat gebeuren;
- Hoe u ons kunt bereiken bij vragen.

[Voorgaande nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.](#)

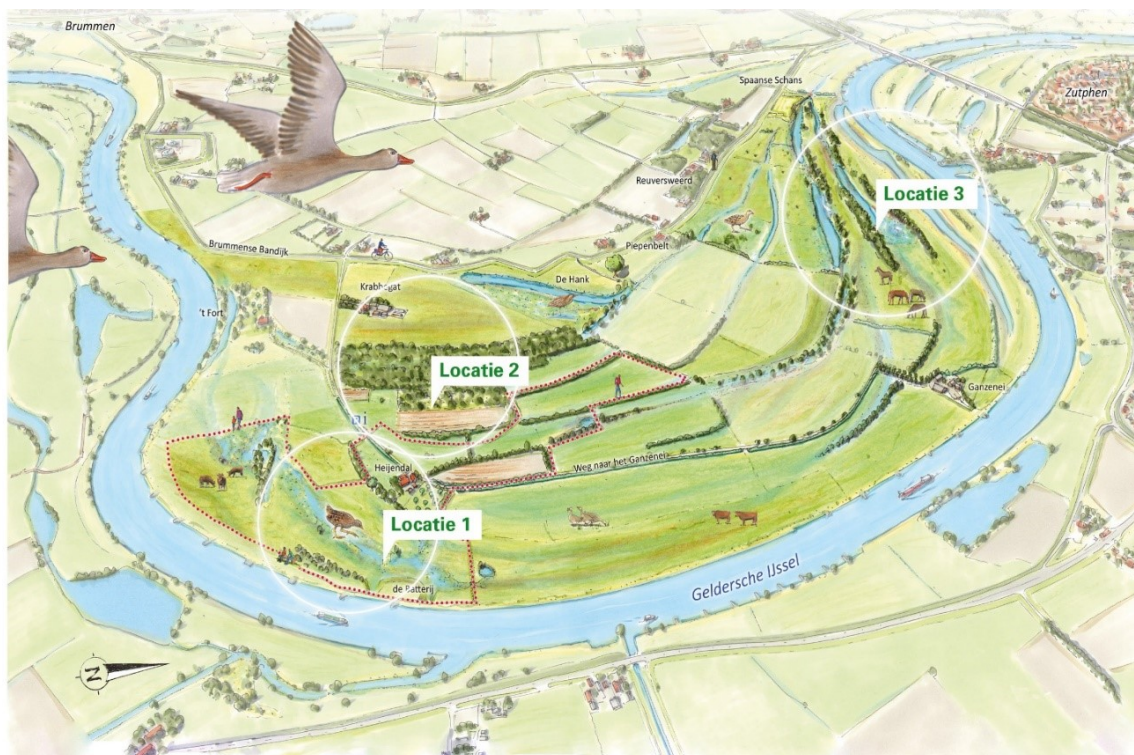

Korte terugblik

Het doel van het project is om het huidige gebied in Cortenoever zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat. Een natuurgebied met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, komen daardoor weer terug in de uiterwaarden.

Om dit te realiseren, wordt gewerkt aan het volgende:

- Uiterwaardverlaging door het uitdiepen van oorspronkelijke kronkelwaardgeulen. Hierdoor komt er meer water in de uiterwaarden. Daarnaast breiden we het bloemrijk grasland uit;
- Het uitbreiden van de bestaande boskernen met onder andere hardhout ooibos. Dit ooibos is zeldzaam in Nederland.

Meer informatie over de achtergrond van het project (o.a. in ontwerptekeningen en filmpjes) kunt u vinden op de volgende website: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/cortenoever.



Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Graafwerkzaamheden Noord

Na het overplaatsen van de overslagponton, welke gebruikt wordt om de grond middels schepen af te voeren over het water, zijn we vorige periode aan de noordzijde begonnen met de graafwerkzaamheden en het afvoeren van grond. Hier herstellen we een aantal smalle en brede geulen, welke over een langere periode zijn dichtgeslibd, tot hun oorspronkelijke geulvormen. Zo worden deze geulen weer watervoerend gemaakt, met als doel om een milieu- en habitatype te ontwikkelen dat geschikt is voor verschillende flora en fauna.

Renovatiewerkzaamheden sluisje Spaanse Schans

De afgelopen periode is aan de voor- en achterzijde van het sluisje bij de Spaanse Schans bodembescherming geplaatst om het wegspoelen van grond door hoge stroomsnelheden tegen te gaan. Daarmee zijn de renovatiewerkzaamheden aan het sluisje gereed en alle werkzaamheden met betrekking tot de kunstwerken in het projectgebied afgerond.

Geïnteresseerdenwandeling 9 november

Woensdag 9 november vond de tweede geïnteresseerdenwandeling plaats. Op deze mooie herfstdag hebben we met circa 35 omwonenden en geïnteresseerden een wandeling van ongeveer twee uur gemaakt door het projectgebied. Dit keer liepen we door het noordelijke gebied, wat normaal niet toegankelijk is voor publiek. Zo bood de wandeling een mooie kans om het prachtige gebied van dichtbij te ervaren. Tijdens de wandeling zijn de werkzaamheden in het noordelijk gebied toegelicht door projectteamleden van Van den Herik en de opdrachtgever.



Technisch Manager Koen Akkers van Rijkswaterstaat informeert de wandelaars over de renovatiewerkzaamheden aan het sluisje bij de Spaanse Schans



Hydraulische kraan is bezig met het ontgraven van smalle geulen in de noordzijde van het projectgebied.



Bodembescherming geplaatst bij het sluisje t.p.v. de Spaanse Schans



Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Onderaan deze pagina ziet u in hoofdlijnen de planning voor de resterende werkzaamheden van het project. Een aantal punten willen we hieruit toelichten:

1. Werkzaamheden zuidkant

In december wordt gestart met het aanplanten van de eerste bomen van het nieuwe oobos. Daarnaast wordt in de komende weken begonnen met het aanbrengen van de afrasteringen in het zuidelijk deel van het projectgebied. In het gehele projectgebied komt in totaal ca. 6 kilometer aan afrasteringen.

2. Werkzaamheden noordkant

Momenteel zijn we bezig met de graafwerkzaamheden aan de noordkant van het gebied. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting tot eind januari 2023 duren. In januari 2023 zullen we ook beginnen met het aanbrengen van de afrasteringen in het noordelijk deel van het projectgebied.

| Activiteit | Status | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Projectvoorbereiding & voorbereidende werkzaamheden | Gereed | | | | | | |
| Graafwerkzaamheden Zuid | Gereed | | | | | | |
| Inzaaien beplanting Natuurcompensatie | Gereed | | | | | | |
| Werkzaamheden kunstwerken | Gereed | | | | | | |
| Graafwerkzaamheden Noord | In uitvoering | | | | | | |
| Aanbrengen afrastering | Gepland | | | | | | |
| Planten oobos | Gepland | | | | | | |

Overzichtsplanning Werkzaamheden Cortenoever



Hoe kunt u ons bereiken?

BouwApp

Naast de gebruikelijke communicatie met bijvoorbeeld deze nieuwsbrief kunt u ook op de hoogte blijven over de voortgang van het project middels de BouwApp. In de aankomende periode zullen wij daar updates plaatsen over de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast kunt u ook via de app vragen stellen of contact opnemen. Via het volgende stappenplan kunt u de BouwApp gebruiken:

1. Download en installeer 'De BouwApp' via [Google Playstore](#) of [Apple Store](#);
2. Ga naar: 'zoek op projectnaam of plaats';
3. Zoek op 'Ecologische optimalisatie Cortenoever';
4. Klik op het project;
5. Klik op 'volgen'.

Telefonisch/E-mail

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Redmer Leegstra. Hij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op het volgende nummer:

- 06-51 06 36 95

Via de e-mail kunt u ons bereiken via:

- vdh-cortenoever@herik.nl

Vriendelijke groet namens het projectteam van Van den Herik Sliedrecht



de BouwApp.

